

# GARANTIDOKUMENTATION

**En förutsättning för att garantin skall gälla är att detta protokoll fylls i och att en kopia mailas eller skickas till Corroventa. Detta innebär också att installationen dokumenteras.**

Tillverkningsnr: \_\_\_\_\_ (Ex 11 300TT2 001) Installationsdatum: \_\_\_\_\_  
år maskintyp Löpnr.

Arbetsordernr.: \_\_\_\_\_

Kontor: \_\_\_\_\_ Installatör: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_


## INSTALLATION

Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Postadress: \_\_\_\_\_

Grov skiss på grunden:

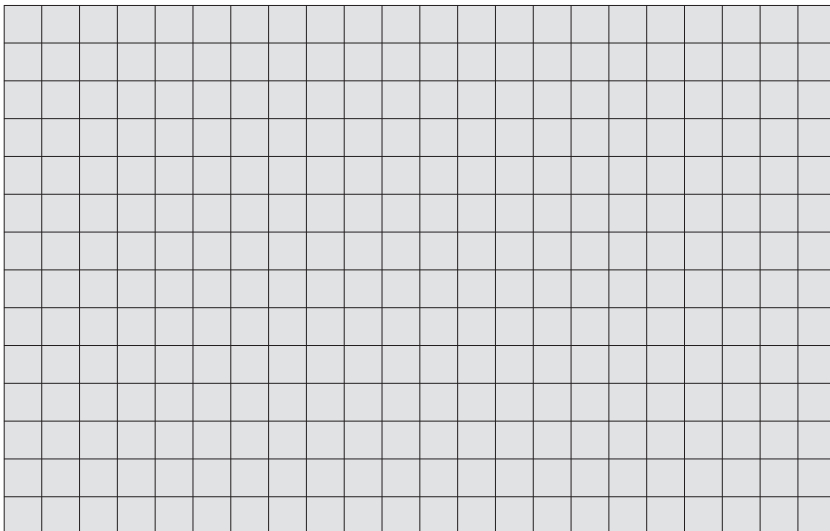

Längd: \_\_\_\_\_ m

Bredd: \_\_\_\_\_ m

Höjd: \_\_\_\_\_ m

dvs ca \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Markera avfuktaren med:  A

Kontrollenheten:  K

Torrfluftrör: \_\_\_\_\_

1 ruta = 1m

## Förutsättningar:

Rinner det in vatten i grunden?  Ja  Nej

Finns det fungerande dränering runt grunden?  Ja  Nej

Är grunden tätad ordentligt?  Ja  Nej

Heltäckande plast på marken?  Ja  Nej

Luktproblem?  Ja  Nej

Radonproblem?  Ja  Nej

Har våtluftslangen mjuk böj?  Ja  Nej

Spjällinställning. (Gäller endast 300TT2)  1A  2A  2B endast vid radonproblem

(Ställ spjällen på 1A. Vid mycket stark lukt på 2A tills lukten är borta, därefter alltid på 1A).

Om Ja uppmätt värde \_\_\_\_\_ Bq

\*OBS! Alla ändringar som påverkar en fastighets ventilation eller tryckbalans kan leda till förändrad radongaskoncentration. När en avfuktare placeras i en fastighet med radon ska man vända sig till fackman för att säkerställa en lämplig helhetslösning.

## Är installationen gjord med:

Torrflutrör Ø100  Ja  Nej

Corroventa monteringskit Multi TT  Ja  Nej

Corroventa luftmunstycke (dysor)  Ja  Nej

Kontinuerlig fläktdrift  Ja  Nej

Är kontrollenehten placerad mitt i grunden i höjddled och så att den inte påverkas av varmt, kallt, torrt eller fuktigt drag?  Ja  Nej

Vad är fuktkvoten i trossbottens trämaterial i anslutning till kontrollenheten? \_\_\_\_\_ %

Luftfuktighet: \_\_\_\_\_ % RF

Mätt med: \_\_\_\_\_

## FUNKTIONSKONTROLL

### Ställ in RF-värdet så att maskinen avfuktar under funktionstesten

Fungerar kontrollsystemet?  Ja  Nej

Snurrar rotorn?  Ja  Nej

Kommer det ut våtluft, är den varm?  Ja  Nej

Är det dräneringshål i våtluftsslangen?  Ja  Nej

## EFTERKONTROLL

### Görs inom max ett år.

Datum: \_\_\_\_\_ Drifttid: \_\_\_\_\_ Sign: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Vad är fuktkvoten i trossbottens trämaterial i anslutning till kontrollenheten? \_\_\_\_\_ %

Fungerar kontrollenheten?  Ja  Nej

Snurrar rotorn?  Ja  Nej

Kommer det ut våtluft, är den varm?  Ja  Nej

Är det dräneringshål i våtluftsslangen?  Ja  Nej

Filterbyte  Ja  Nej

Syns några skador i grunden?  Ja  Nej

Om ja, kort beskrivning \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Några anmärkningar i övrigt t ex från kund \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
